

Szakmai beszámoló

**a LEADER térségek közötti
együttműködés keretében
megvalósuló**

**„Esélyt az állatoknak” Gyepmesteri
telep létesítése c. projektről**

1. Alapadatok

A pályázat benyújtásának időpontja: 2013.11.29

A támogatási határozatok kelte: 2014.10.14

A projektben résztvevő partnerek száma: 4

Az együttműködés célja, tartalma: egy gyepmesteri telep létrehozásával megoldást találni a kóbor állatok által okozott rendezetlen helyzet XXI. századnak megfelelő, európai szintű rendezése. A projekt megvalósítása során felépül a gyepmesteri telep épülete és a telep működéséhez szükséges eszközök is beszerzésre kerülnek. A projekt megvalósítását követően Egyek Nagyközség Önkormányzata biztosítja a gyepmesteri szolgáltatás elindítását. Az együttműködő partnerek vállalják a gyepmesteri telep igénybe vételét.

2. Megvalósításban résztvevő partnerek

A projektet koordináló szervezet

Név: Egyek Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 4069 Egyek, Fő u. 3

Támogatási határozat száma: 1695612413

Támogatási összeg: 49 580 923 Ft

Regisztrációs szám: 1005243242

Együttműködő partnerek

1.

Név: Tiszacsege Város Önkormányzata

Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Támogatási határozat száma: 1695612202

Támogatási összeg: 66 000 Ft

Regisztrációs szám: 1005318546

2.

Név: Tiszadorogma Községi Önkormányzat

Székhely: 3466 Tiszadorogma, Arany János út 21.

Támogatási határozat száma: 1695612192

Támogatási összeg: 30 000 Ft

Regisztrációs szám: 1003075865

3.

Név: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület

Székhely: 4071 Hortobágy, Czinege János út 1.

Támogatási határozat száma: 1695612404

Támogatási összeg: 36 000 Ft

Regisztrációs szám: 1008629690

3. A projekt szakmai megvalósítása

A támogató határozatot 2014. október 17-én vettük kézhez. Ezt követően haladéktalanul megkezdtük a projekt megvalósítását, tekintettel a támogató határozatban szereplő szűkös megvalósítási határidőre (2015. május 31.).

A közbeszerzési eljárás bonyolításával 2014.10.30-án megbíztuk a Kovács Ügyvédi Irodát. Továbbá a kiviteli tervek elkészítésével 2014.11.03-án a 4K Stúdiót.

A közbeszerzési eljárás bonyolítására ezt követően került sor. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően, még 2014. december 23-án megkötöttük a kivitelezési szerződést, az eljárás nyertesével, az UNIVERSAL BAU '96 Bt-vel, aki a hideg időjárási viszonyok ellenére még január elején megkezdte a kivitelezést. A műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Presztizs Team Kft-t, azon belül Bátorfi József Attilát bíztuk meg.

A beruházás megvalósítására Egyek külterületén, a 03227/4 hrsz-ú ingatlanon került sor, amely terület korábban lőtérként funkcionált.

Terveink szerint a létesítmény két ütemben valósul meg: I. ütemben (a pályázat részeként) a főépület és a hozzá kapcsolódó, 15 állat befogadására alkalmas kennel sor épül meg, ez képezte a v kivitelezővel kötött szerződés műszaki tartalmát is. II. ütemben pedig a hiányzó kennelek kerülnek megépítésre. Az első ütem kialakítása lehetővé teszi a gyepmesteri telep teljeskörű működését.

A kivitelezővel kötött szerződés szerint a munkálatokat április 30-ig be kellett fejezni. Ez meg is történt, a kivitelező április 30-án készre jelentette a munkálatokat. Még az elhúzódó műszaki átadás-átvételi eljárás ellenére is sikerült május 29-re jogerős használatba vételi engedélyt szereznünk.

Az építési kivitelezési munkálatokkal párhuzamosan megkezdődött a telep működéséhez nélkülözhetetlen eszközök beszerzése. E tevékenység az együttműködő partnerekkel közösen lett megvalósítva. az eszközök jó részét Egyek nagyközség Önkormányzata szerezte be, azonban 1-1 eszköz megvásárlását az együttműködő partnerek végezték.

A pályázat benyújtásakor alacsonyabb árajánlatot adó partnerek lettek megbízva az eszközök leszállításával, azaz a bútorok esetében a Fitt-Fa- Forma Bt, az orvosi eszközök vonatkozásában a Medicor Kéziműszer Zrt, a hűtőszekrények vonatkozásában a City-Gas Kereskedőház Zrt., továbbá az elektromos főzőlap vonatkozásában az Elektro-Quality Kft.

Négy eszköz esetében tértünk el a pályázatban eredetileg jelzett beszállítótól. A 3 férőhelyes öltözőszekrény, az egyedi öltözőpad, az egyedi mosogató szekrény és a kombinált kézmosó – beépített bútorként - részét képezte az építési kivitelezővel megkötött szerződésnek.

Együttműködő partnereink is beszerezték a pályázatban vállalt eszközt, estükben sem volt eltérés a pályázatban eredetileg jelzett beszállítótól (Medicor Kéziműszer Zrt.).

A pályázatban megjelölt eszközök mindegyikét beszereztük, sem típusban, sem darabszámban nem tértünk el az eredeti tartalomtól, azaz az eszközök műszaki paraméterei azonosak a pályázatban jelzettekkel.


A projekt megvalósítása során a helyi újságban tudósítottuk a lakosságot a projekt előrehaladásáról, három alkalommal jelent meg ezzel kapcsolatban fényképes összefoglaló az Egyeki Hírmondóban.



4. A projekt várható eredményei

Eredmények:

- a térségben hiánypótló minőségi szolgáltatás jelenik meg,
- egy korábbi LEADER program keretében képzett ebrendész szakemberek számára a munkahely biztosított,
- örökbefogadás lehetőségének megteremtése,
- növekedett az együttműködő települések kapcsolatteremtési lehetősége,
- kialakul a térségben a felelős állattartás,
- csökken az egészségügyi fertőzésveszély kialakulásának veszélye,
- a kóbor, gazdátlan ebek száma csökken, és csökken az elhullott állatok száma is,
- nő a közbiztonság
- az őshonos és védett vadállomány, valamint a háziállatok nagyobb biztonságba kerülnek.

5. Fotódokumentáció

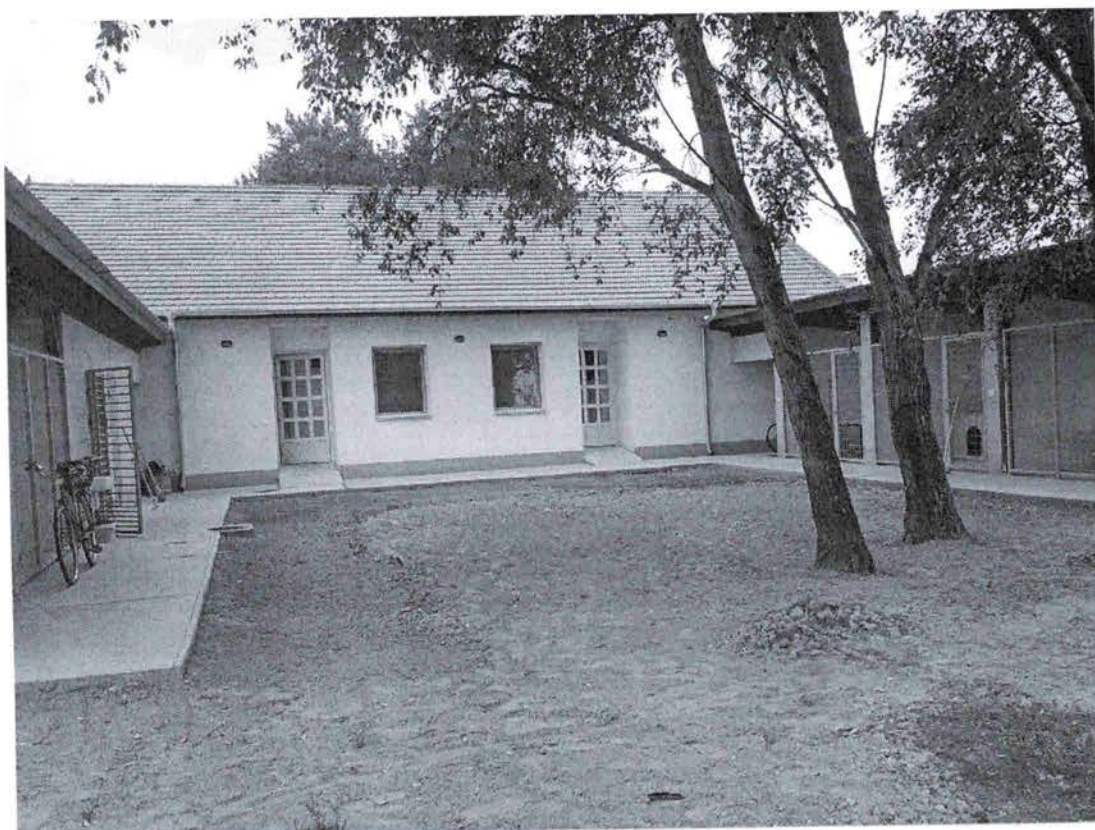

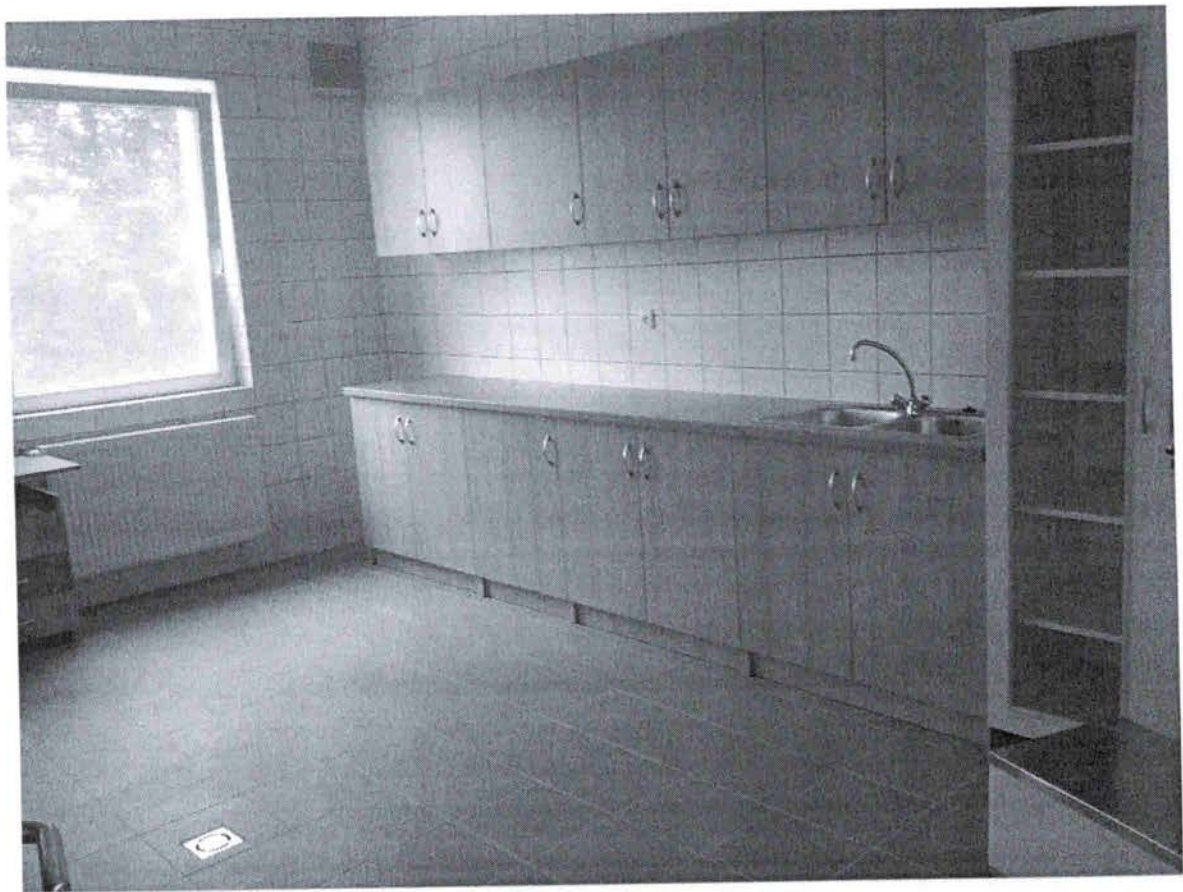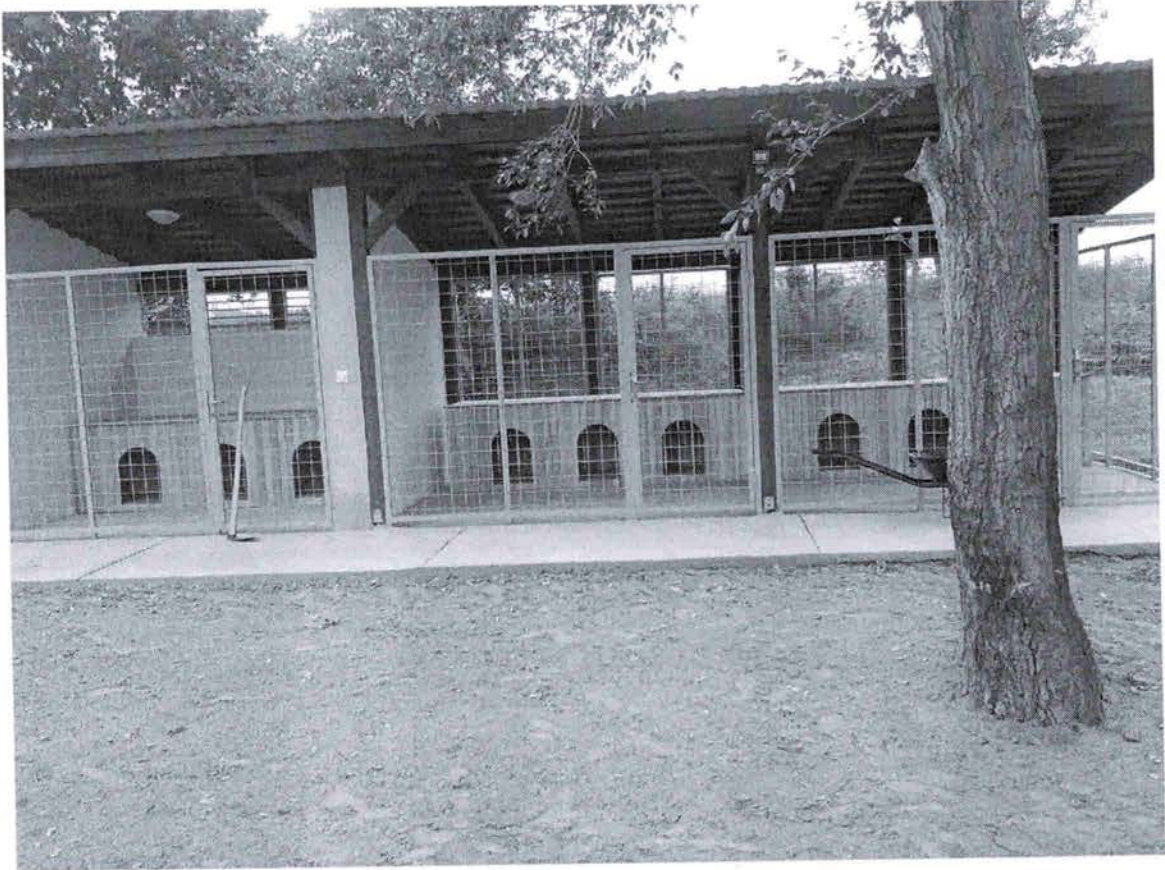



Egyek, 2015.06.08




Dr. Miluczky Attila
polgármester
